


シールド掘進・組立進捗図


○: 路線計画図該当箇所

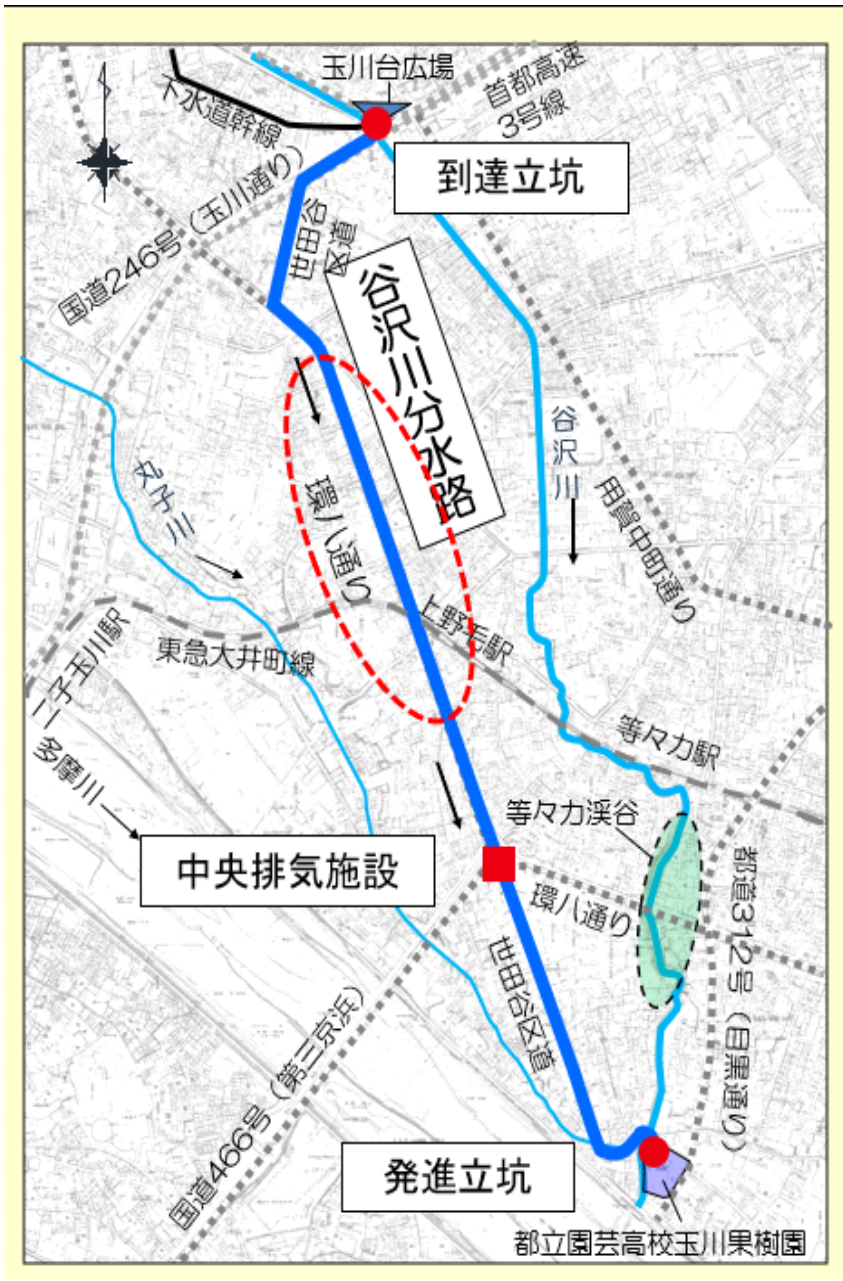

2022年7月16日現在
 2047Ring掘進組立完了
 組立延長: 1969.45m
 掘進延長: 1975.04m


2022年7月23日(予定)

2022年7月30日(予定)

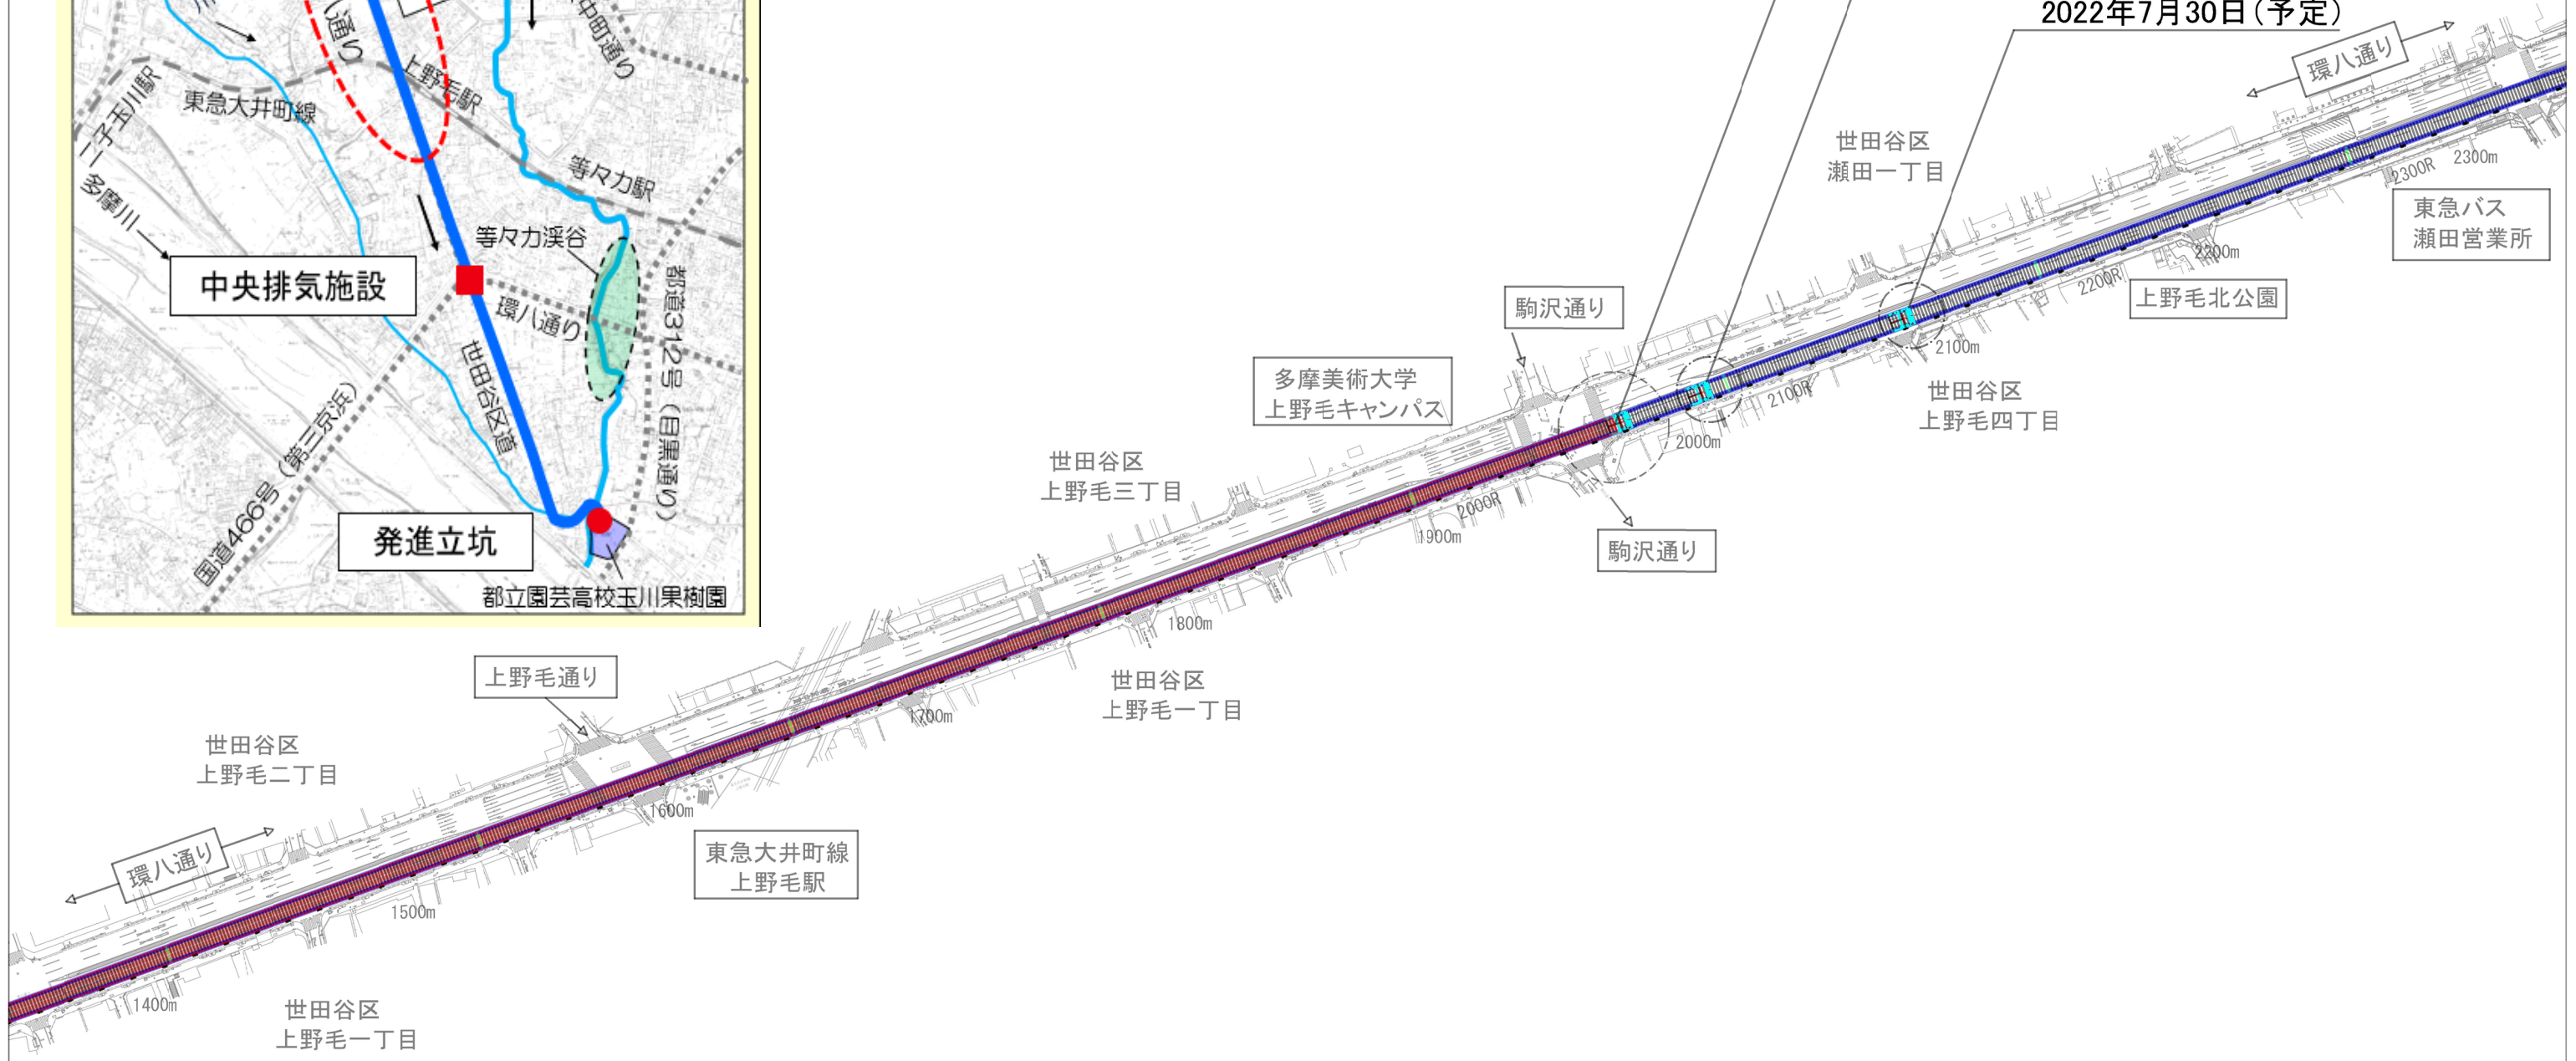

シールド掘進・組立進捗図

世田谷区
瀬田一丁目

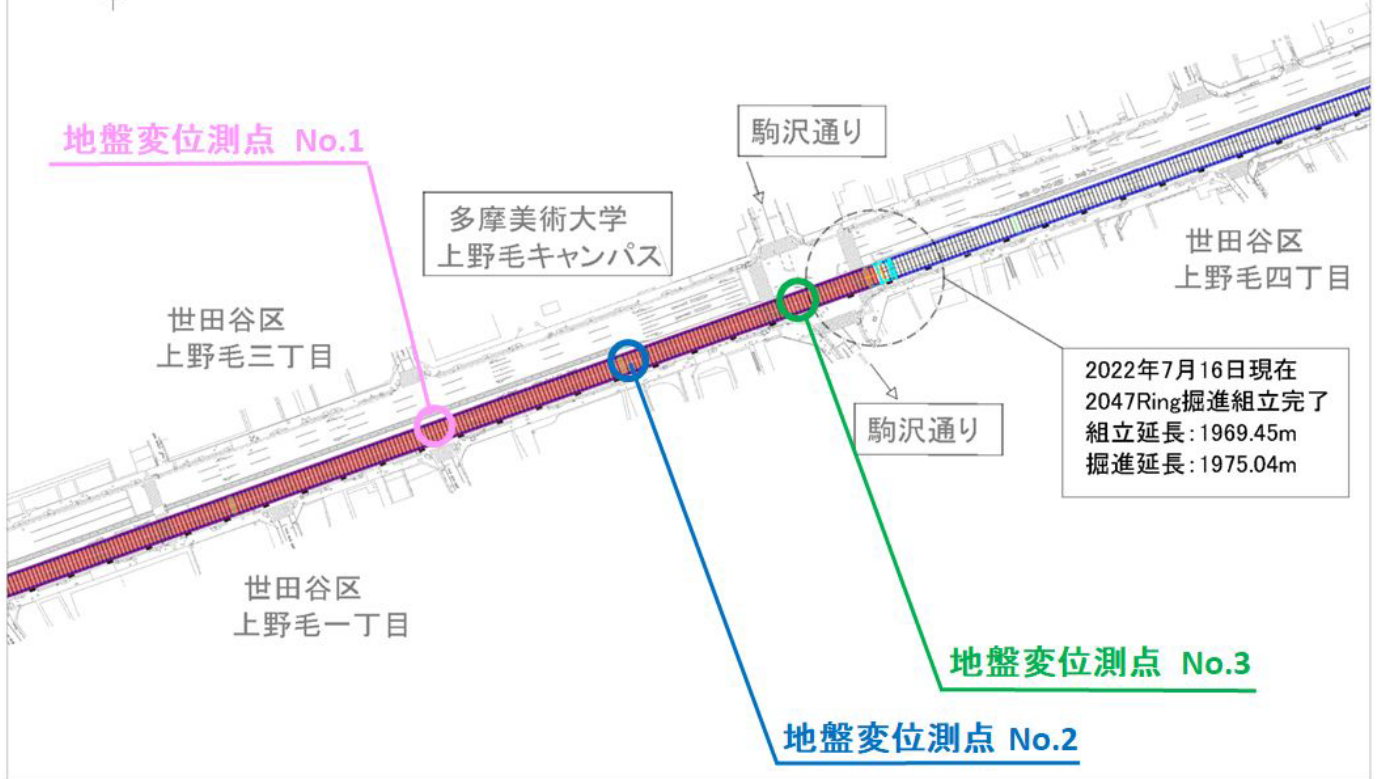

地盤変位量推移 2022年7月1日～2022年7月15日

