


# シールド掘進・組立進捗図



2022年4月16日現在  
1323Ring掘進組立完了  
組立延長:1100.65m  
掘進延長:1106.24m

2022年4月23日(予定)

2022年4月30日(予定)

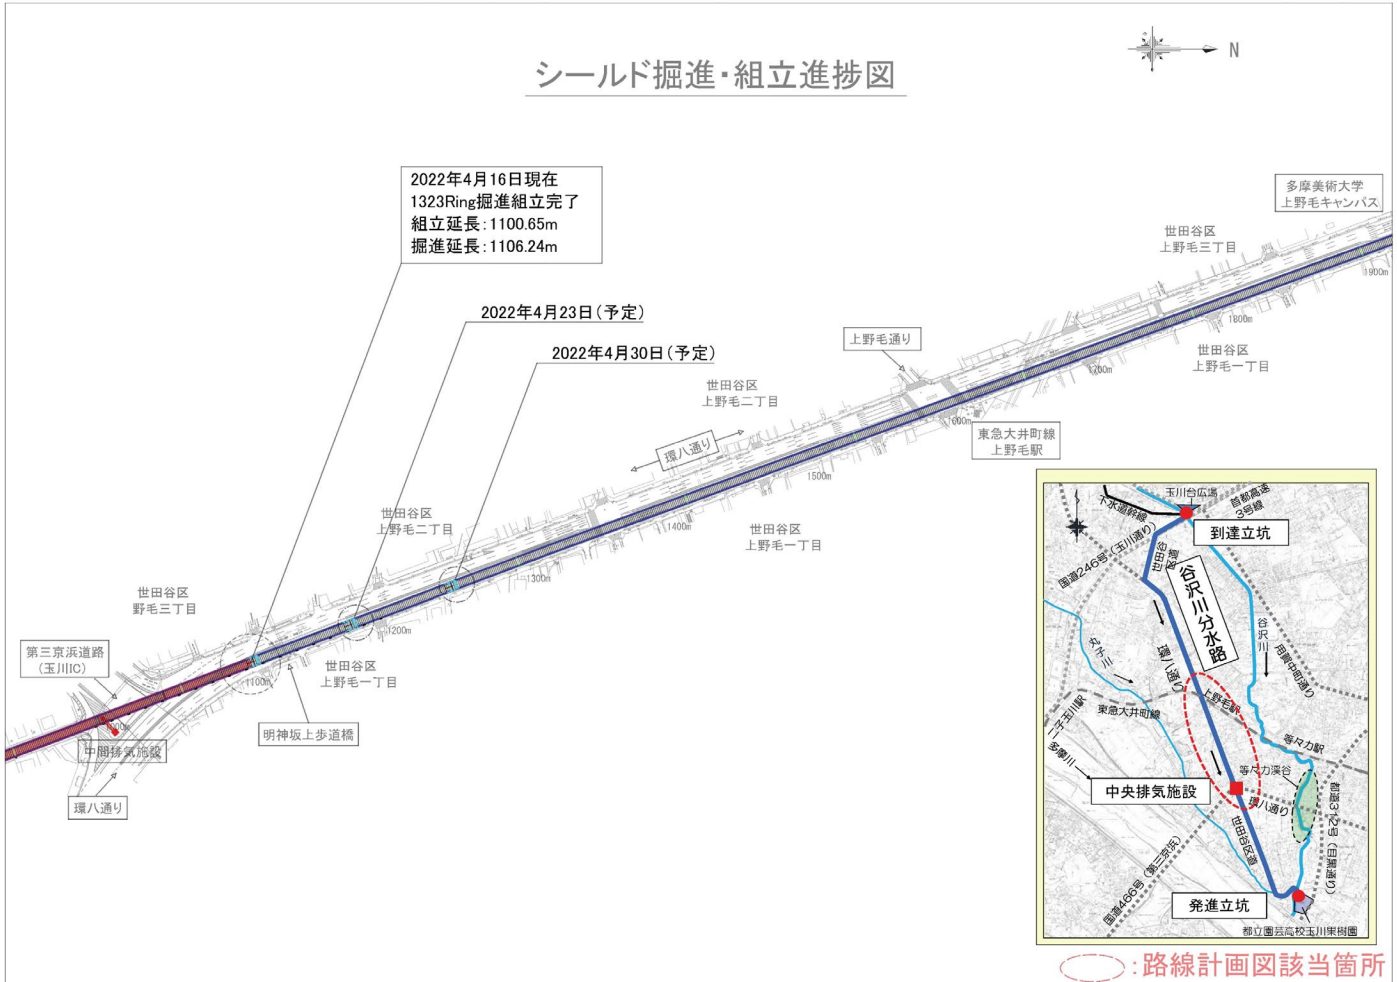

多摩美術大学  
上野毛キャンパス

世田谷区  
上野毛三丁目

世田谷区  
上野毛一丁目

東急大井町線  
上野毛駅

世田谷区  
上野毛二丁目

世田谷区  
上野毛一丁目

世田谷区  
上野毛二丁目

世田谷区  
野毛三丁目

世田谷区  
上野毛一丁目

第三京浜道路  
(玉川IC)


明神坂上歩道橋

環八通り



○: 路線計画図該当箇所

# シールド掘進・組立進捗図

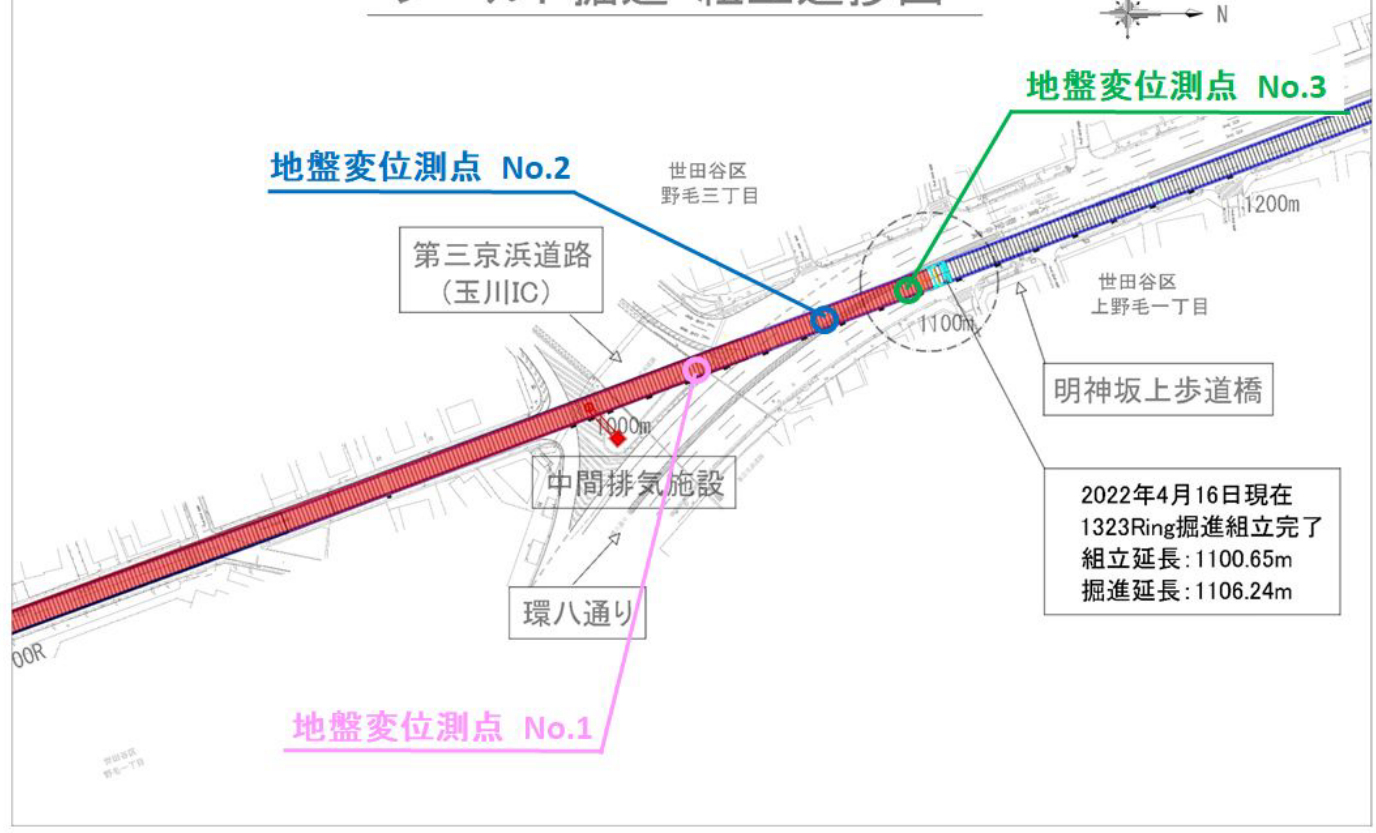

地盤変位量推移 2022年4月1日～2022年4月15日

