



工事概要


工事場所：青森県青森市大字駒込地内
 工事目的：駒込川（堤川）の洪水調節、流水の正常な機能の維持、発電
 工期：2019年3月16日～2031年11月28日
 発注者：青森県
 工事内容：重力式コンクリートダム（堤高84.5m、堤体積31.7万m³）

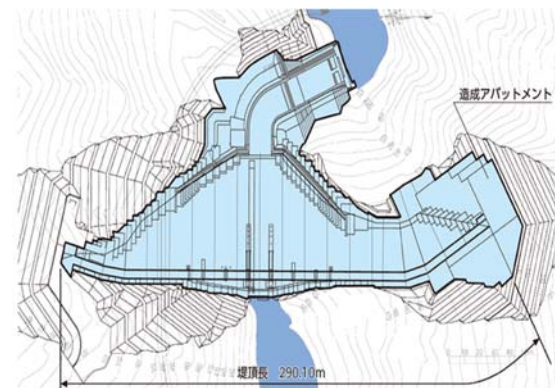

堤体平面図

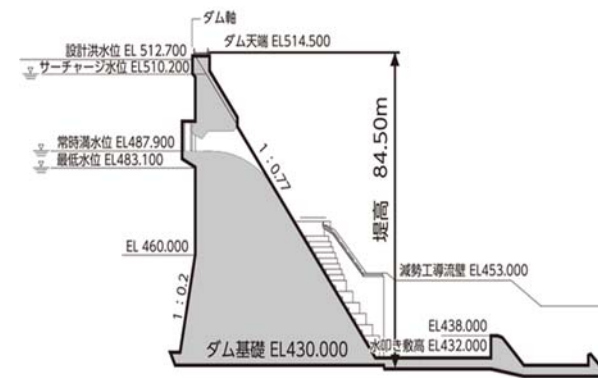

堤体断面図

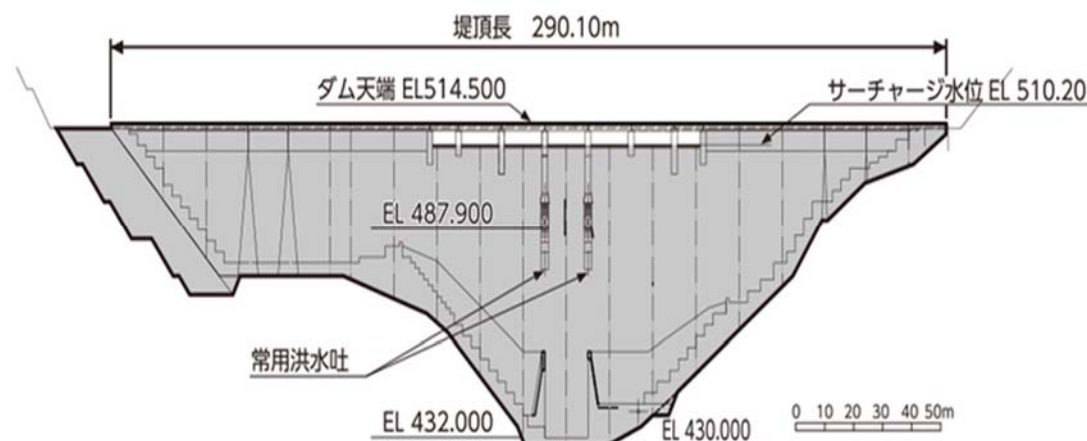

堤体下流面図

工事進捗状況

冬期間の現場閉鎖が終了し、4月より場内道路の除雪を実施しています。4月下旬までに除雪を完了して令和5年度の本格的工事を再開します。



現場入口付近（2023.2）



場内除雪状況（2023.4）

今後の作業について（R5.4～R5.6）

除雪完了後、堤外仮排水路トンネルの覆工、右岸工事用道路、堤体基礎掘削、4号斜面对策工等の作業を行います。

工種	摘要	単位	数量	令和5年度		
				4月	5月	6月
準備工		式	1			
除雪工		式	1			
転流工	覆工、インバート	m	345			
	吐口部	式	1			
4号斜面对策工	抑止杭	式	1			
右岸工事用道路工		式	1			
左岸重機道路排土工		m ³	22,000			

工事へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。



安藤ハザマ・日本国土開発・鹿内組 JV

〒030-0943 青森県青森市大字幸畑字阿部野 52-1

TEL:017-764-1820 駒込ダム HP: <https://ad-hzm.jp/komagomedamu/>
