

工事概要

工事場所：青森県青森市大字駒込地内

工事目的：駒込川（堤川）の洪水調節、流水の正常な機能の維持、発電

工期：2019年3月16日～2031年11月28日

発注者：青森県


工事内容：重力式コンクリートダム（堤高 84.5m、堤体積 31.7 万 m³）




駒込ダム




完成予想図

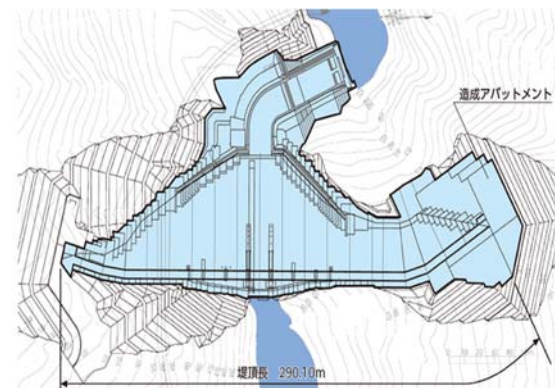

堤体平面図

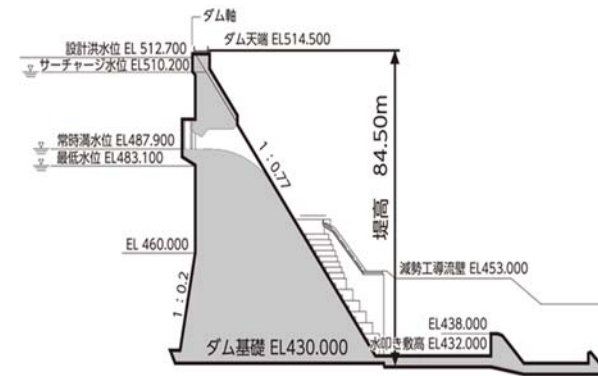

堤体断面図

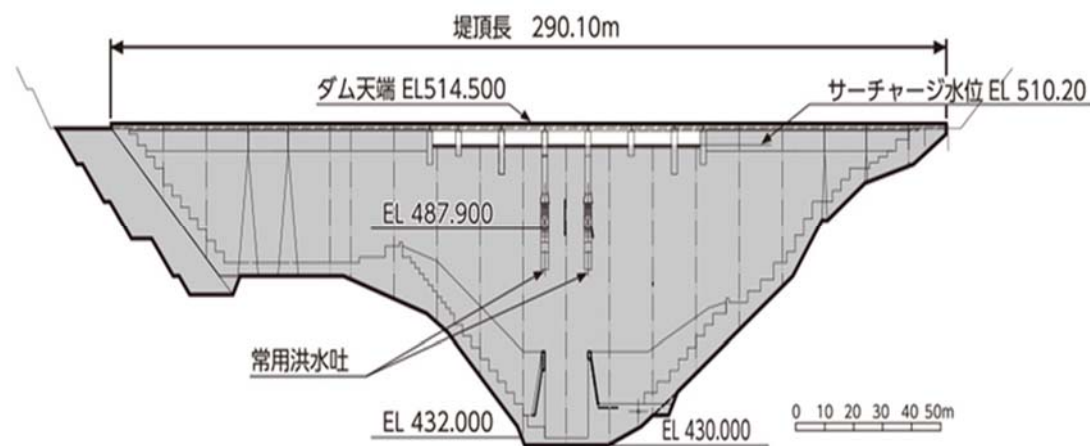

堤体下流面図

工事進捗状況

令和5年度の工事が本格的に行われています。堤外仮排水路トンネルの覆工、右岸工事用道路の架設、左岸重機道路の掘削を中心に施工を進めています。



堤外仮排水トンネル



右岸工事用道路



左岸重機道路



駒込ダム情報館（銅像茶屋駐車場）

今後の作業について（R5.7～R5.9）

工種	摘要	単位	年 月	令和5年度		
				数量	7月	8月
転流工	覆工、インバート	m	345	[Progress bar]		
〃	吐口部	式	1	[Progress bar]		
〃	呑口部	式	1	[Progress bar]		
4号斜面对策工	アンカー工	本	15	[Progress bar]		
右岸工事用道路工		式	1	[Progress bar]		
左岸重機道路工	掘削工	m ³	22,000	[Progress bar]		
〃	法面工	式	1	[Progress bar]		

工事へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。



安藤ハザマ・日本国土開発・鹿内組 JV

〒030-0943 青森県青森市大字幸畑字阿部野 52-1

TEL:017-764-1820 駒込ダム HP : <https://ad-hzm.jp/komagomedamu/>
