

工事概要

工事場所：青森県青森市大字駒込地内

工事目的：駒込川（堤川）の洪水調節、流水の正常な機能の維持、発電

工期：2019年3月16日～2031年11月28日

発注者：青森県


工事内容：重力式コンクリートダム（堤高 84.5m、堤体積 31.7 万 m³）




駒込ダム




完成予想図

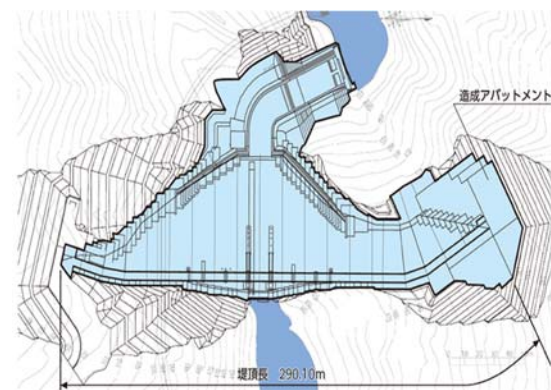

堤体平面図

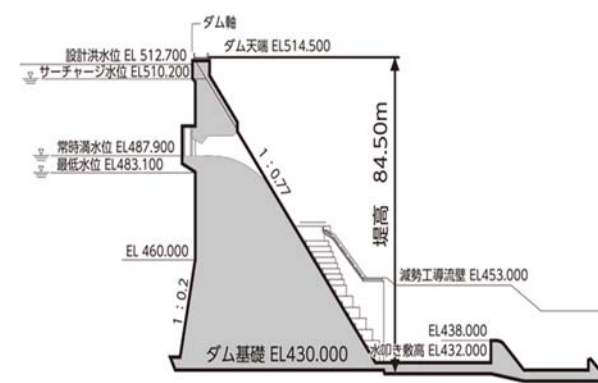

堤体断面図

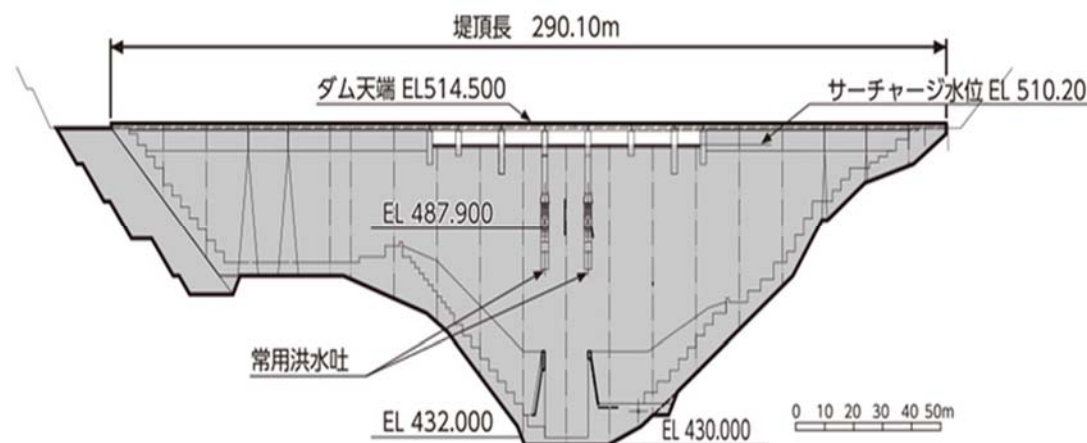

堤体下流面図

工事進捗状況

現在、場内工事用道路の除雪を進めています。4月より、令和6年度工事が本格的に開始され、転流工（呑口構造物、堤外仮排水トンネル）、呑口上部斜面对策工、4号工事用道路拡幅工を中心に施工を進めます。



場内除雪状況



場内道路状況

今後の作業について（R6.4～R6.6）

工種	摘要	単位	年月	令和6年度		
				数量	4月	5月
除雪工・準備工		式	1	■		
堤外仮排水トンネル		式	1	■	■	
呑口構造物		式	1	■	■	■
閉塞工（基礎処理）	堤外仮排水トンネル	式	1	■	■	■
4号工事用道路拡幅		式	1	■	■	■
伐採工		式	1		■	■

工事へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。



安藤ハザマ・日本国土開発・鹿内組 JV

〒030-0943 青森県青森市大字幸畑字阿部野 52-1

TEL:017-764-1820 駒込ダム HP: <https://ad-hzm.jp/komagomedamu/>
