

## 工事概要


工事場所：青森県青森市大字駒込地内  
 工事目的：駒込川（堤川）の洪水調節、流水の正常な機能の維持、発電  
 工期：2019年3月16日～2031年11月28日  
 発注者：青森県  
 工事内容：重力式コンクリートダム（堤高84.5m、堤体積31.7万m<sup>3</sup>）




駒込ダム




完成予想図

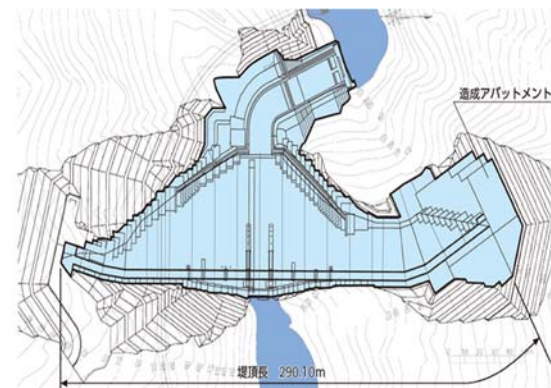

堤体平面図

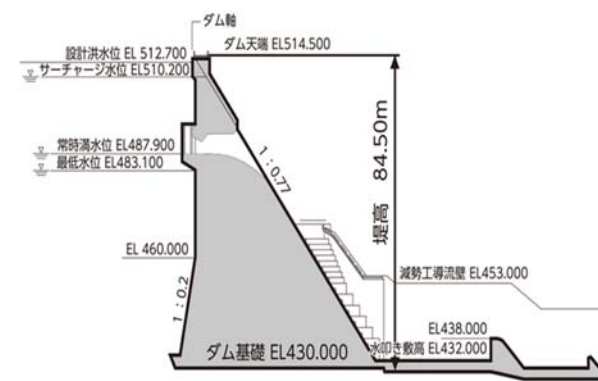

堤体断面図

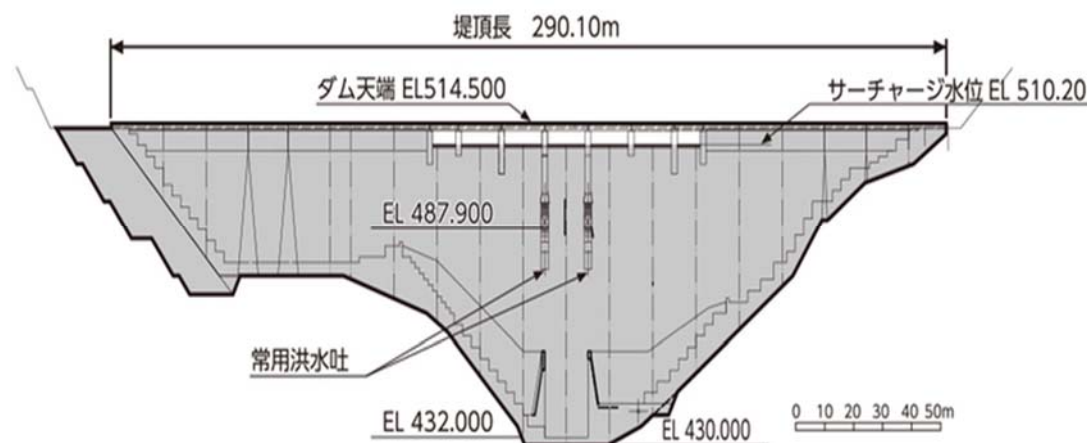

堤体下流面図

## 工事進捗状況

7月2日に現在の河川を仮排水路トンネルへ切替える転流を実施します。転流後は、本格的にダム本体の基礎掘削を開始する予定です。その他、呑口上部斜面对策工、転流工（上下流締切）、4号工事用道路拡幅工を中心に施工を進めます。



ダムサイト（右岸より）



呑口構造物全景

## 今後の作業について（R6.7～R6.9）

工種	摘要	単位	年月	令和6年度		
				7月	8月	9月
上下流締切		式	1	[Progress bar]		
堤体基礎掘削		式	1	[Progress bar]		
堤体法面工		式	1	[Progress bar]		
呑口上部法面工		式	1	[Progress bar]		
4号工事用道路拡幅		式	1	[Progress bar]		
粗骨材ストックヤード		式	1	[Progress bar]		
伐採工		式	1	[Progress bar]		

工事へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。



安藤ハザマ・日本国土開発・鹿内組 JV

〒030-0943 青森県青森市大字幸畑字阿部野 52-1

TEL:017-764-1820 駒込ダム HP: <https://ad-hzm.jp/komagomedamu/>
