



工事概要


工事場所：青森県青森市大字駒込地内
 工事目的：駒込川（堤川）の洪水調節、流水の正常な機能の維持、発電
 工期：2019年3月16日～2031年11月28日
 発注者：青森県
 工事内容：重力式コンクリートダム（堤高84.5m、堤体積31.7万m³）

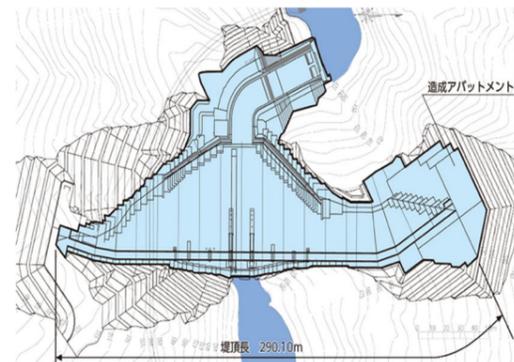

堤体平面図

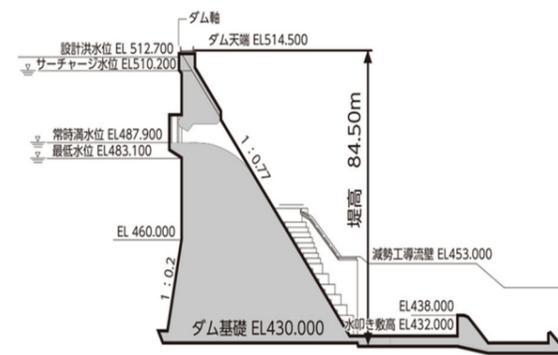

堤体断面図

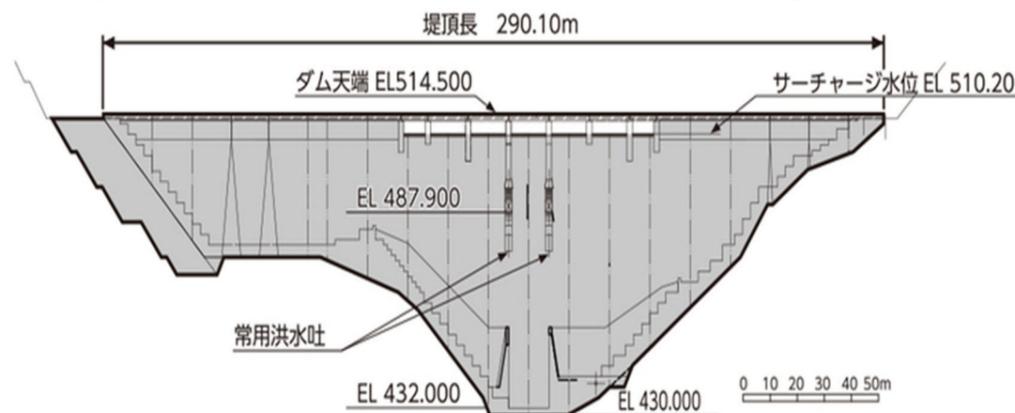

堤体下流面図

工事進捗状況

左右岸の堤体基礎掘削とそれに伴い、法面の保護工を実施します。その他、連絡通路用立坑掘削、右岸進入路整備、仮設工（仮設ヤード整備、索道運転、濁水処理運転）の施工を進めます。9月以降には骨材の運搬を予定しています。



下流より全景 (R7.6.21)



ダムサイト左岸側 (R7.6.21)

今後の作業について (R7.7~R7.9)

工種	摘要	単位	年月	令和7年		
				数量	7月	8月
堤体基礎掘削	左右岸	式	1	[Progress bars for July, August, September]		
法面保護工	左右岸	式	1	[Progress bars for July, August, September]		
堤体工	骨材運搬	式	1			[Progress bar for September]
雑工	管理用通路(立坑)	式	1	[Progress bars for July, August, September]		
仮設工	索道、濁水P	式	1	[Progress bars for July, August, September]		
〃	仮設ヤード整備	式	1	[Progress bars for July, August, September]		

工事へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。



安藤ハザマ・日本国土開発・鹿内組 JV

〒030-0943 青森県青森市大字幸畑字阿部野 52-1

TEL:017-764-1820 駒込ダム HP: <https://ad-hzm.jp/komagomedamu/>
