



工事概要


工事場所：青森県青森市大字駒込地内
 工事目的：駒込川（堤川）の洪水調節、流水の正常な機能の維持、発電
 工期：2019年3月16日～2031年11月28日
 発注者：青森県
 工事内容：重力式コンクリートダム（堤高84.5m、堤体積31.7万m³）

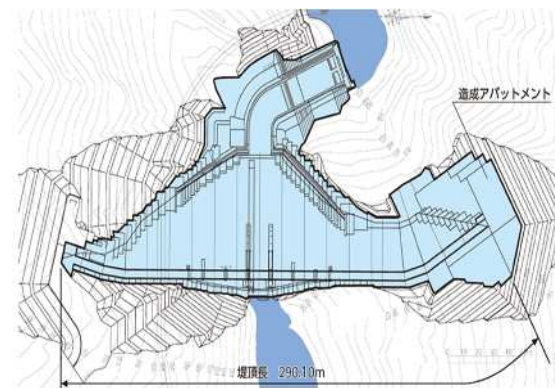

堤体平面図

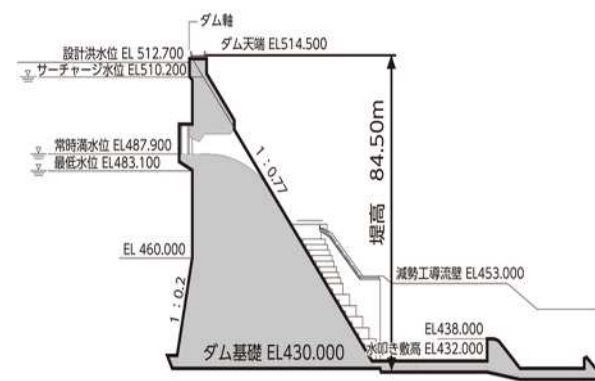

堤体断面図

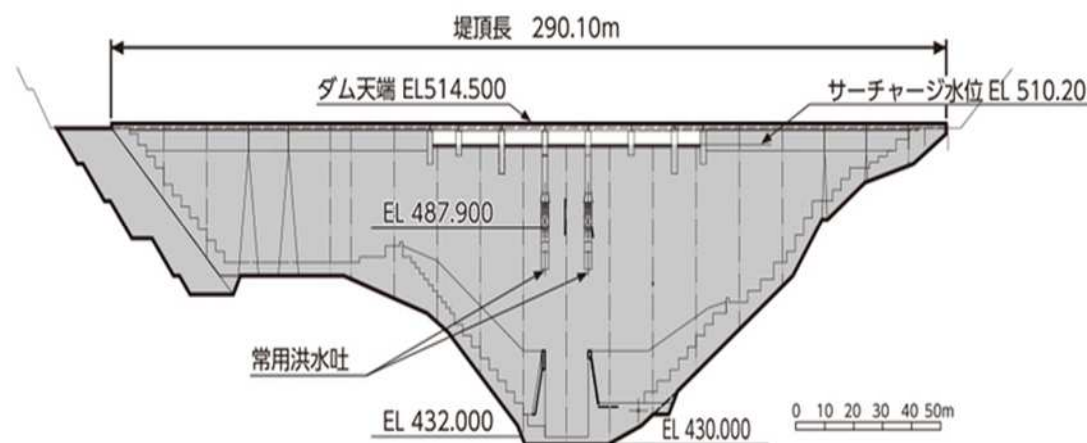

堤体下流面図

工事進捗状況

現在、場内の除雪を進めています。5月より、令和8年度工事を本格的に開始し、左右岸基礎掘削工、法面保護工、連絡通廊（立坑）、仮設工（索道運転、濁水処理運転、コンクリート製造設備組立）を中心に施工を進めます。また、5月よりダムコンクリート用骨材の運搬（平内町の採石場から場内への運搬・仮置き）を予定しています。



下流より全景（R8.3.13）



場内除雪状況

今後の作業について（R8.4～R8.6）

工種	摘要	単位	年月	令和8年度		
				数量	4月	5月
準備工		式	1			
除雪工		式	1			
堤体基礎掘削	左右岸	式	1			
法面保護工	左右岸	式	1			
堤体工	骨材運搬	式	1			
雑工	管理用通路(立坑)	式	1			
仮設工	索道、濁水P	式	1			

工事へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。



安藤ハザマ・日本国土開発・鹿内組 JV

〒030-0943 青森県青森市大字幸畑字阿部野 52-1

TEL:017-764-1820 駒込ダム HP: <https://ad-hzm.jp/komagomedamu/>
