

工事概要


工事場所：青森県青森市大字駒込地内

工事目的：駒込川（堤川）の洪水調節、流水の正常な機能の維持、発電


工 期：2019 年 3 月 16 日～2031 年 11 月 28 日

発注者：青森県


工事内容：重力式コンクリートダム（堤高 84.5m、堤体積 31.7 万 m³）

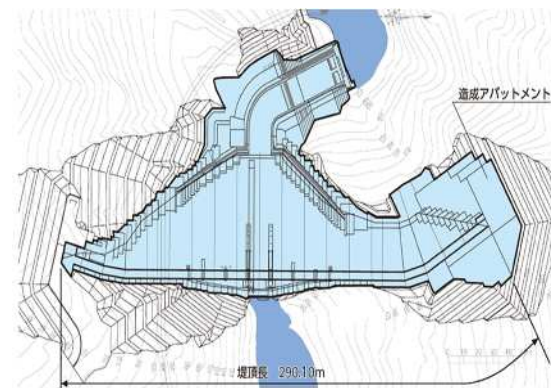

堤体平面図

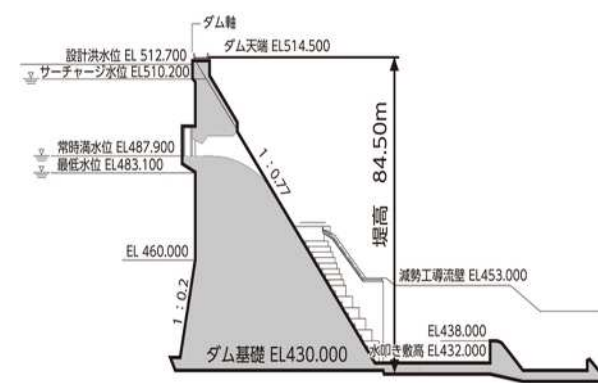

堤体断面図

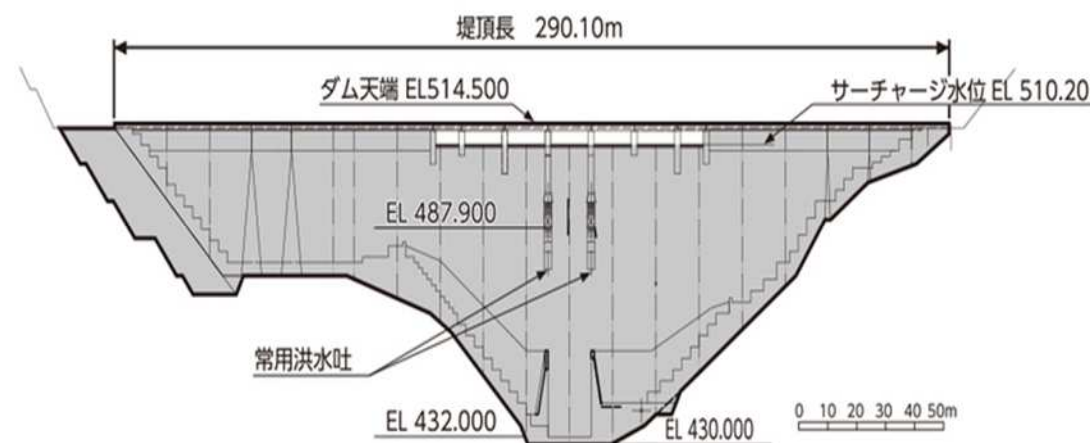

堤体下流面図

工事進捗状況

左右岸の堤体基礎掘削とそれに伴い、法面の保護工を実施しています。その他、連絡通廊用立坑・水平坑の掘削、仮設工（コンクリート製造設備組立、右岸工事用道路の延伸、索道運転、濁水処理設備の運転）、ダムコンクリート用骨材の運搬・仮置きを進めています。今年度の冬季閉鎖は 2026 年 11 月中旬を予定しています。



下流より全景（R8.9.30）



仮設備ヤード（R8.9.30）

今後の作業について（R8.10～R8.12）

工 種	摘 要	単 位	年 月 数 量	令和 8 年度		
				10月	11月	12月
堤体基礎掘削	左右岸	式	1			
法面保護工	左右岸	式	1			
堤体工	骨材運搬	式	1			
雑工	管理用通路(立坑・水平坑)	式	1			
仮設工	索道、濁水P	式	1			
〃	コンクリート製造設備据付	式	1			
〃	右岸工事用道路	式	1			

工事へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。



安藤ハザマ・日本国土開発・鹿内組 JV

〒030-0943 青森県青森市大字幸畑字阿部野 52-1

TEL:017-764-1820

駒込ダム HP : <https://ad-hzm.jp/komagomedamu/>
