月 間 工 程 表

工事件名	工 期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年11月14日	青:予定

2022年5月
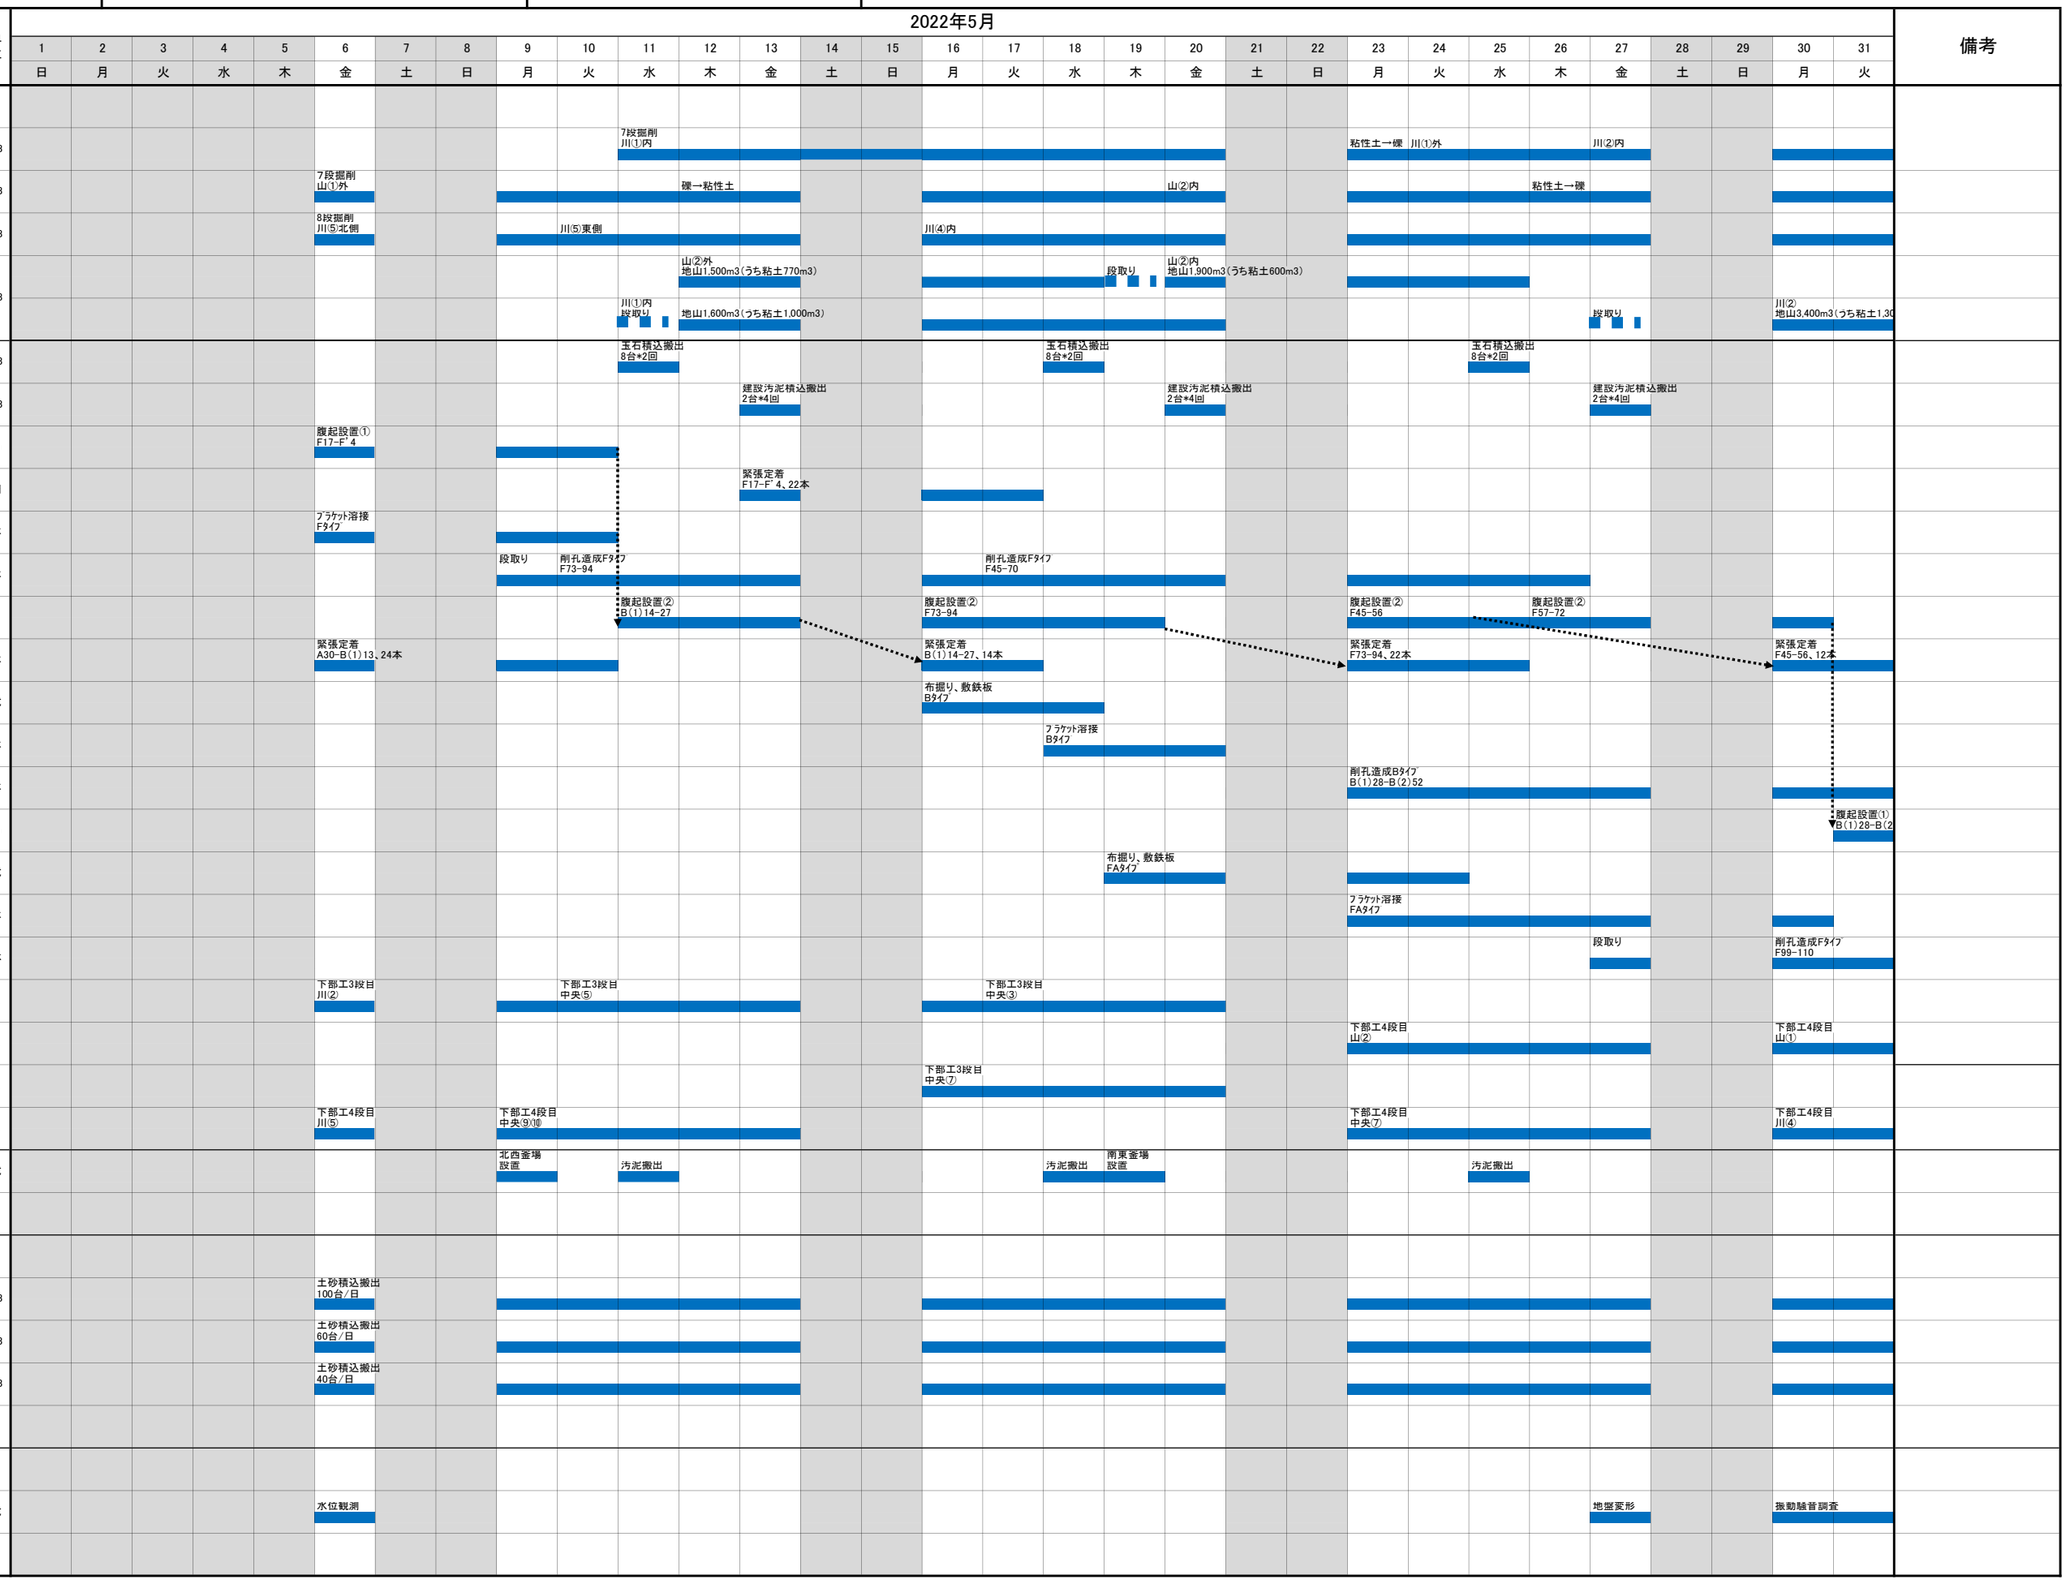
	工種		数量	単位	備考
主要工程表	【調節池ヤード】				
	掘削工	7段掘削(掘削班①)	30,566	m3	
	－〃－	7段掘削(掘削班②)	30,566	m3	
	－〃－	8段掘削(掘削班①)	29,887	m3	
	－〃－	7段目粘性土改良(①)	6,500	m3	
	－〃－	－〃－粘性土改良(②)			
	－〃－	玉石積込搬出(UCRへ)	8,664	m3	
	－〃－	産廃積込搬出(建設汚泥)	3,219	m3	
	土留工(6段目)	腹起設置(1号側)	466	m	
	－〃－	緊張定着(1号機)	135	個	
	土留工(7段目)	ﾌﾞﾗｹｯﾄ溶接	350	本	
	－〃－	ｱﾝｶｰ削孔造成(2号機)	123	本	
	－〃－	腹起設置(2号側)			
	－〃－	緊張定着(2号機)	123	本	
	－〃－	鉄板敷設、布掘り	1	式	
	－〃－	ﾌﾞﾗｹｯﾄ溶接	350	本	
	－〃－	ｱﾝｶｰ削孔造成(1号機)	135	本	
	－〃－	腹起設置(1号側)	466	m	
	土留工(8段目)	鉄板敷設、布掘り	1	式	
	－〃－	ﾌﾞﾗｹｯﾄ溶接	350	本	
	－〃－	ｱﾝｶｰ削孔造成(2号機)	52	本	
	仮桟橋工	下部工:3段目設置	171.0	t	
	－〃－	下部工:4段目設置	171.0	t	
	－〃－	下部工:3段目設置	171.0	t	
	－〃－	下部工:4段目設置	174.1	t	
	整備工	窯場整備	1	式	
	【土砂搬出ヤード】				
	運搬工	土砂積込運搬 八王子地区(2)	274,042	m3	
	－〃－	－〃－ 八王子地区(5)	〃	m3	
	－〃－	－〃－ 青梅地区(キ)	〃	m3	
	【その他】				
	環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式
