月 間 工 程 表

工事件名	工 期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年11月14日	青：予定
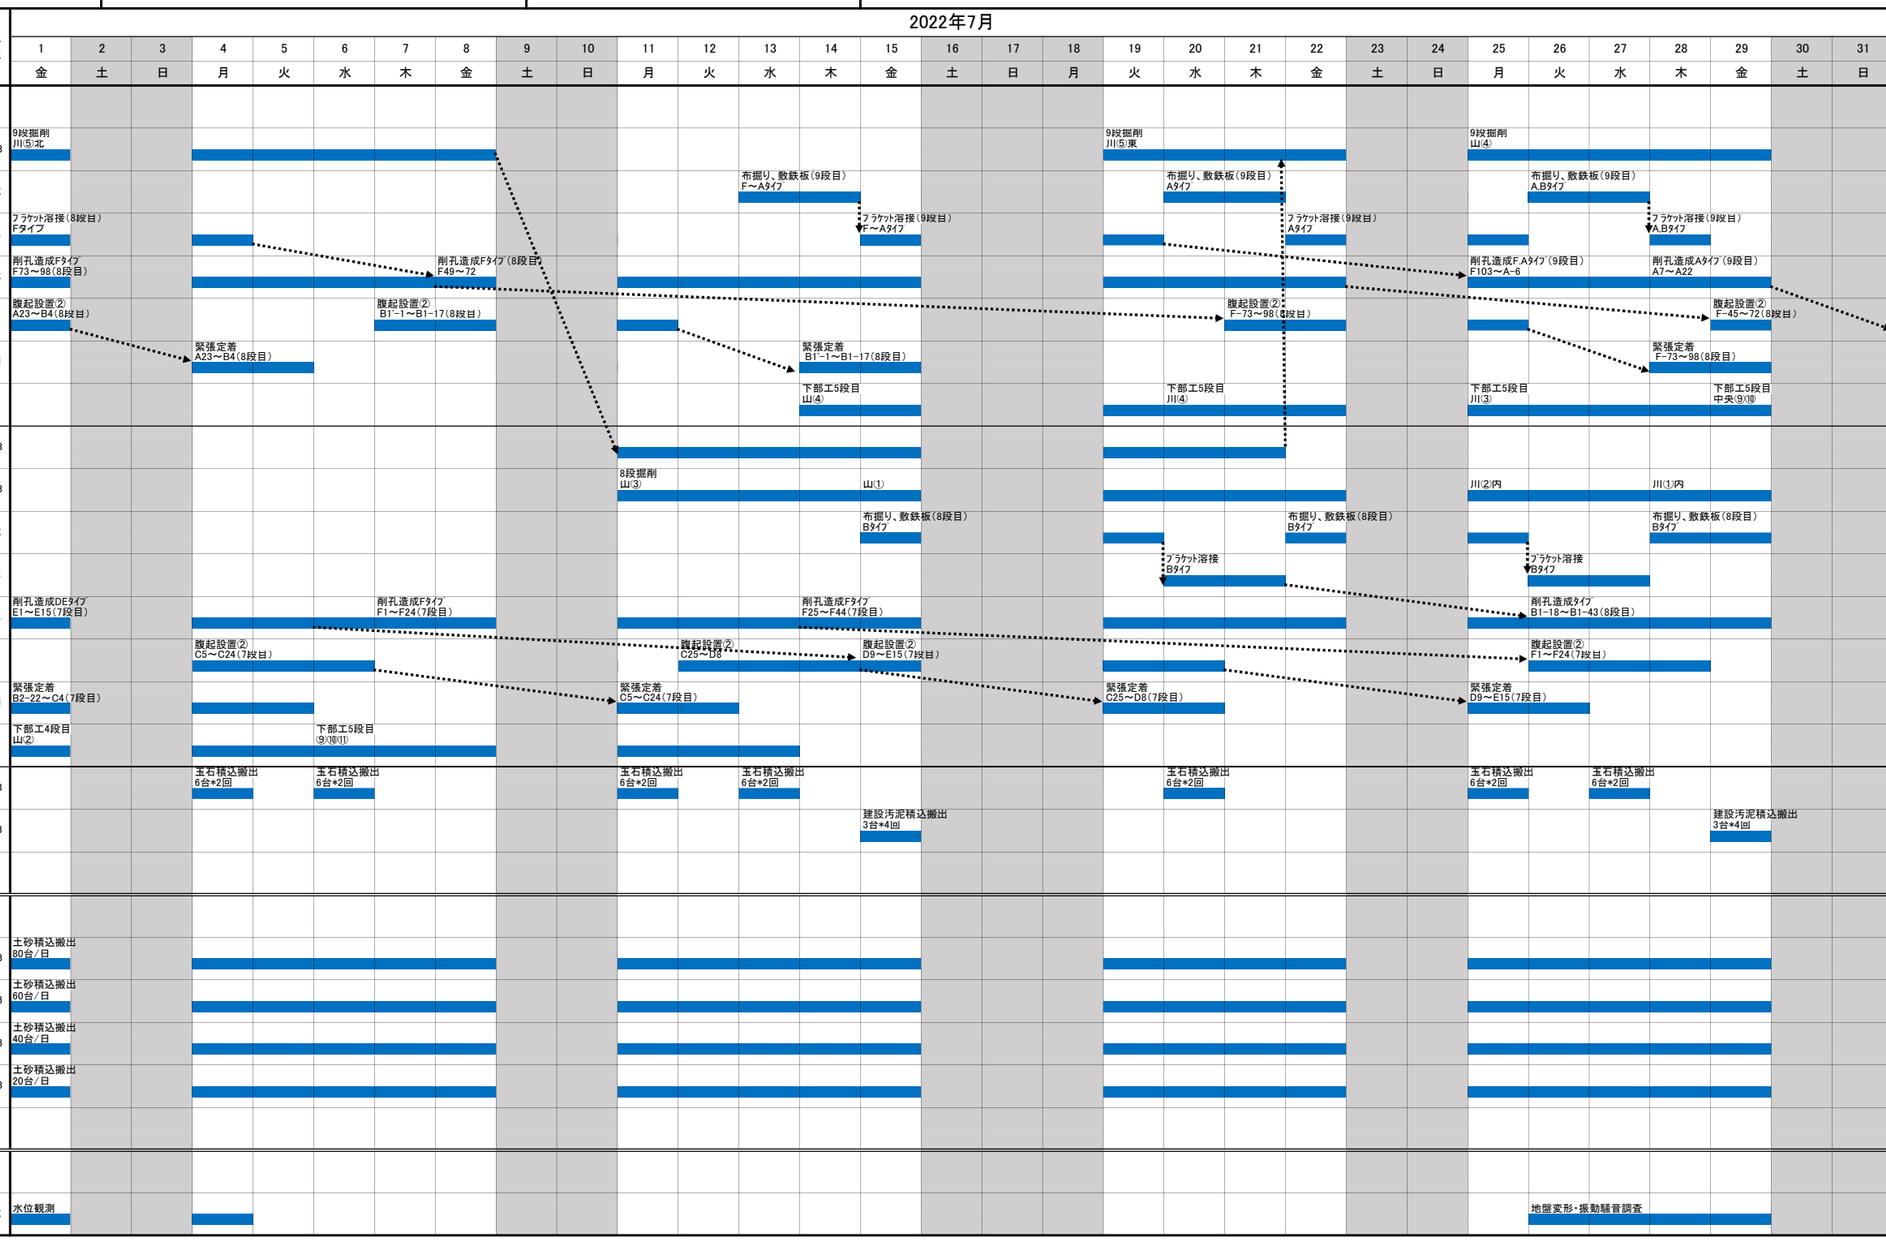
		工 種		数量	単位	備考
主要工程表		【調節池ヤード】				
	北側先行	掘削工	9段掘削（掘削班①）	29,887	m3	
		土留工（8,9段目）	鉄板敷設、布掘り	1	式	
		－〃－	ﾌﾞﾗｹｯﾄ溶接	350	本	
		－〃－	ｱﾝｶｰ削孔造成（2号機）	52	本	
		土留工（8段目）	腹起設置（2号側）	466	m	
		－〃－	緊張定着（2号機）	135	個	
		－〃－	下部工：5段目設置	174.1	t	
	南側後追い	掘削工	9段掘削（掘削班①）	30,566	m3	
		－〃－	8段掘削（掘削班②）	30,566	m3	
		土留工（8段目）	鉄板敷設、布掘り	1	式	
		－〃－	ﾌﾞﾗｹｯﾄ溶接	350	本	
		土留工（7,8段目）	ｱﾝｶｰ削孔造成（1号機）	135	本	
		土留工（7段目）	腹起設置（1号側）	466	m	
		－〃－	緊張定着（1号機）	135	個	
		仮桟橋工	下部工：3,4段目設置	171.0	t	
	共通	掘削工	玉石積込搬出（UCRへ）	8,664	m3	
		－〃－	産廃積込搬出（建設汚泥）	3,219	m3	
		【土砂搬出ヤード】				
		運搬工	土砂積込運搬 八王子地区（2）	274,042	m3	
		－〃－	－〃－ 八王子地区（5）	〃	m3	
		－〃－	－〃－ 青梅地区（キ）	〃	m3	
		－〃－	－〃－ 青梅地区（シ）	〃	m3	
		【その他】				
		環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式
